

附件 1:

2022 年度专项债券项目绩效自评表


项目编号(穿透式监测系统)	P19450200-0121					
项目名称	柳州北部生态新区管道燃气特许经营项目					
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府专项债券(一期)——2022 年广西壮族自治区政府专项债券(五期)					
项目单位	柳州广投北城清洁能源有限公司					
项目单位主管部门	广西柳州市北部生态新区管理委员会					
项目性质	新建项目() 续建项目(√)					
开竣工及收益实现时间	开工时间	2020.4	竣工时间	2029.12	项目收益实现时间	2023.12
项目实施进度安排	LNG 场站、三合大道及石碑坪工业园区的管网建设					
项目资金来源及落实情况(万元)	资金来源	金额(万元)	利率(%)	占比(%)	其中:已到位金额	存量融资抵质押状况
	合计	17781.3	-			
	其中:财政拨款(含预算内基建资金等)	其中:中央	-			
		自治区	-			无
	专项债券资金	2000	3.67	11.25	2000	2020.8



项目概况	自有资金		9912.86	3.32		2022.3
	非政府债券融资资金		5868.44	-	55.75	2018.1
	其中：银行贷款		5868.44		33	
	其他融资资金					
	建设地点	柳州市北部生态新区		建筑面积		
项目总体绩效目标	立项依据	发改委备案证项目代码 2019-450212-45-03-035190				
	项目用途	大力开展柳州北部生态新区用户供气业务				
	可行性和必要性	现阶段柳州市北部生态新区尚未能完全供应天然气。本项目建成后，可为柳州市北部生态新区供应清洁、安全、稳定、可靠的天然气能源，改善北部生态新区的能源消耗结构，为打造绿色、生态、健康的北部生态新区奠定良好的基础。				
	实施(建设)内容	项目分 2 期进行建设，其中：一期：2020 年-2022 年建设 LNG 气化站 1 座，市政中压燃气管网随路敷设 46 公里；二期：2023 年-2029 年建设门站 1 座、高压管线 20 公里、市政中压燃气管网随路敷设 62 公里。				
中期绩效目标 (2020-2022 年)	按用气需求完成柳州北部生态新区管道燃气特许经营项目建设					
自评得分（满分 100 分）	97		专项债券支出进度（10 分）		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标 产出指标 (50 分。其	二级指标 产出数量	指标内容 项目工程 总体完成	指标值 ≥100%	分值 20	完成情况简述 LNG 场站已完 成建设投产，中
						偏差原因及改进措施 无偏差



中：产出数量、质量、成本、时效，成本分别为 20 分、10 分、10 分、10 分（分）	产出数量	量				压管道已按要求供气	
	产出质量	竣工验收合格率	≥95%	10	竣工验收合格率 98%	无偏差	
	产出时效	2022 年 LNG 场站竣工验收	≥100%	10	2022 已竣工	无偏差	
	产出成本	项目债务本息偿付	全部按时支付，不发生债务违约事件	10	全部按时支付，未发生债务违约事件	无偏差	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施	
效果指标 (30 分)	经济效益	改善新区营商环境，清洁能源企业入驻数	≥5	5	已为 3 家企业提供清洁能源	与管委会相关部门对接，对入驻新区企业积极对接开发	
	社会效益	实现新区居民气化率	≥60%	5	新建小区均已按要求接通管道燃气	城乡自建房及部分老旧小区居民不认同管道燃气安装，下一步措施：加大宣传工作，持续推进老旧小区开发	
	生态效益	减少 SO2 排放量	≥1634.5 万吨/年	3	场站供气规模已满足减少 SO2 排放量要求	无偏差	

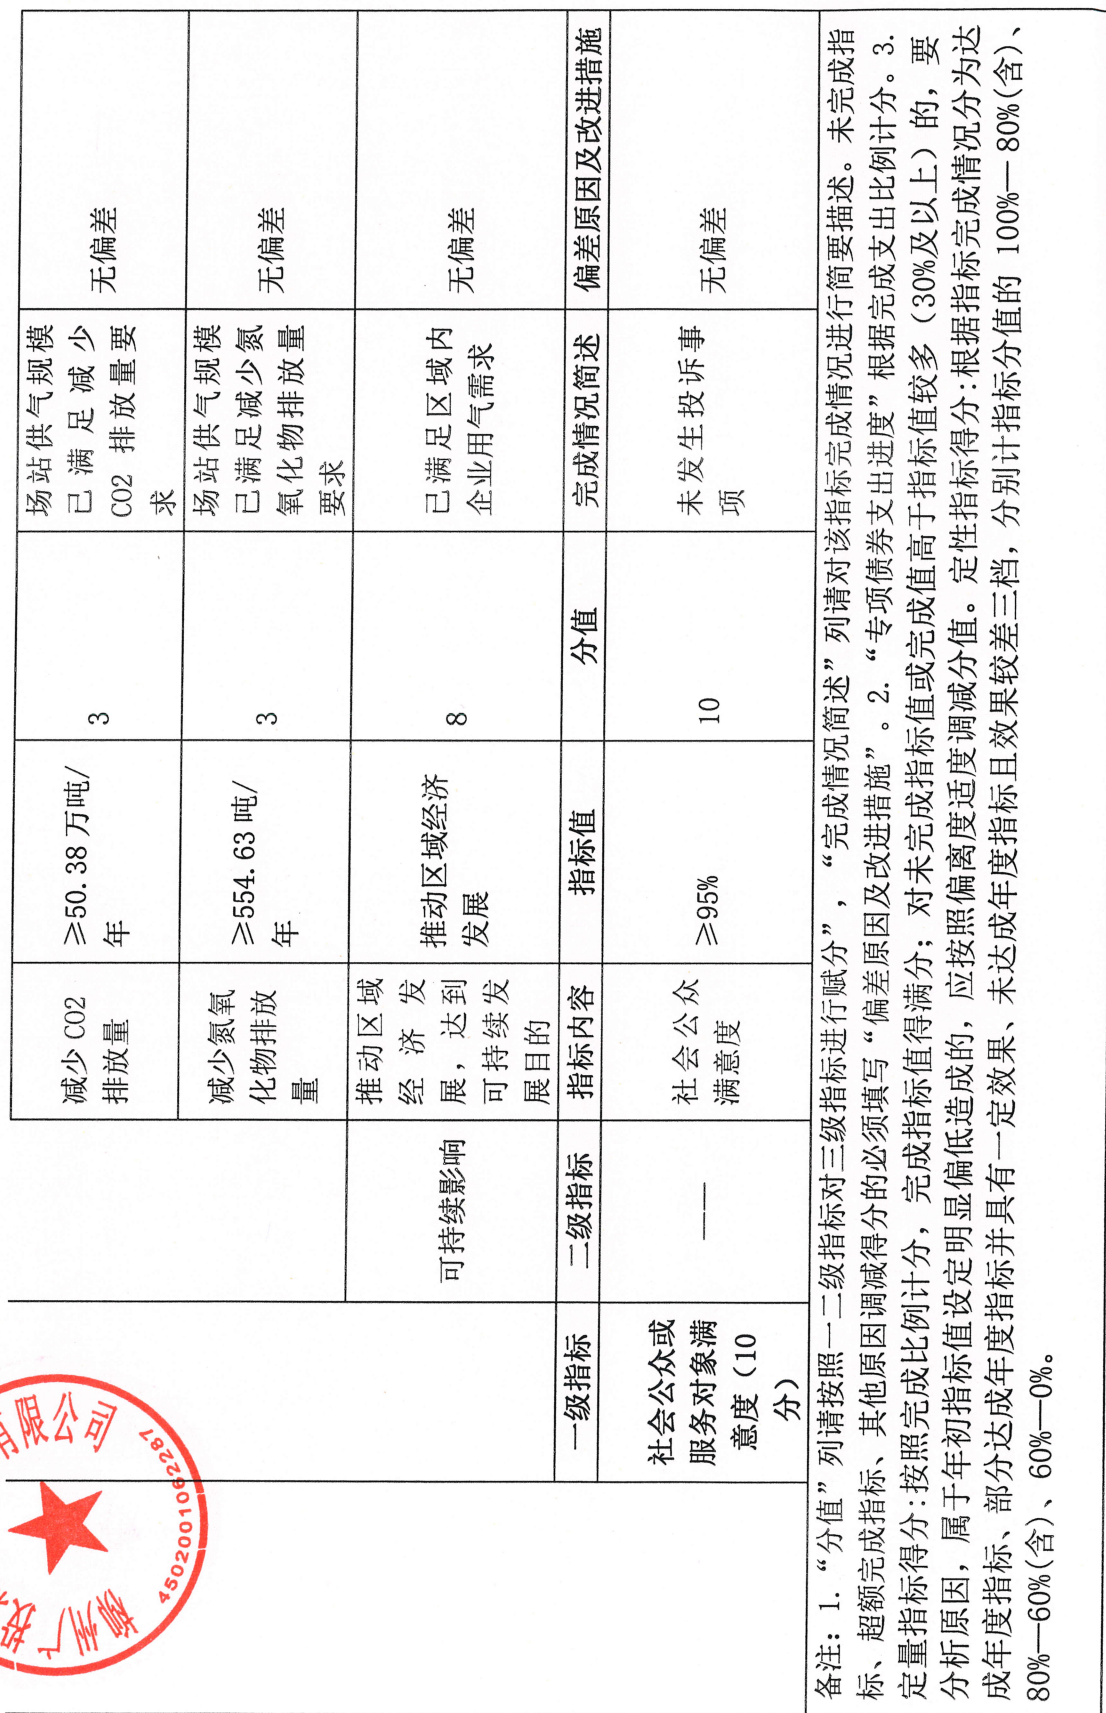

备注:1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分,“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分,完成指标值得满分;对未完成指标值得满分;对未完成指标值得较多(30%及以上)的,要分析原因,属于年初指标值设定明显偏低造成的,应照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别计指标分值的100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。
